



Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

- Information über Ablauf und Umleitung

Vorstellung Baumaßnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP KA)

- Im Auftrag des RP KA wird ab **August 2026** bis voraussichtlich **Juni 2027** die **Bundesstraße 35 / 35a** zwischen **Bruchsal und Graben-Neudorf** auf einer Länge von **rund 8 km** saniert.
- Im Zuge dieser Baumaßnahme wird auch die **Anschlussstelle Bruchsal der Bundesautobahn 5 (BAB 5)** sowie die bahnparallele **Kreisstraße 3575 (K 3575)** zwischen **Bruchsal und Ubstadt-Weiher** auf einer Länge von **rund 2,9 km** saniert.
- Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme erfolgt in **7 Bauabschnitten (BA)**, welche teilweise in weitere Unterabschnitte unterteilt werden. Die Unterteilung wurde so gewählt, dass **Beeinträchtigungen für alle Anwohnenden und Verkehrsteilnehmenden** möglichst gering gehalten werden. Aufgrund der oftmals geringen Fahrbahnbreite muss die Umsetzung der Baumaßnahme in einigen Abschnitten unter Vollsperrung erfolgen.
- Der Verkehr wird umgeleitet; der **Umleitungsverkehr** tangiert Bruchsal mitunter erheblich.

Sanierungsumfang

- Abschnittsweise Erneuerung gebundener Oberbau (Deck-, Binder- und Tragschicht)

- Gesamtmenge: ca. 186.000 m²
 - Bereich B 35 / B 35a: ca. 136.000 m²
 - Bereich BAB A 5: ca. 20.000 m²
 - Bereich K 3575: ca. 28.000 m²

- Erneuerung/Ergänzung Fahrzeugrückhaltesystem
- Erneuerung Entwässerung/Rückhaltebecken
- Bauwerkssanierung/Instandsetzung
- Sanierungskosten: rund 10 Mio. Euro



Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf



Bauablaufplan und verkehrliche Auswirkungen auf Bruchsal

BA	Zeitraum	Maßnahme	Betroffenheit Bruchsal	Auswirkung
1	01.08. – 23.08.2026	Sanierung B 35a und K 3575 (Vollsperrung)	-B 35a zw. B 3 und K 3526 gesperrt -K 3575 gesperrt > Umleitung über B 3 (Bruchsal) -an der Auffahrt B 35 zur K 3526 ist eine LSA vorgesehen	Mittlere Belastung erwartet > kann zu Wartezeiten an LSA am „Weißen Kreuz“ führen
2	24.08. – 04.09.2026	Sanierung B 35 (Vollsperrung)	-Umleitung über Bruchsal (je Fahrtrichtung getrennte Umleitung) -Zufahrt Spargelhof „Böser“ frei	Mittlere Belastung erwartet > kann zu Wartezeiten an LSA am „Weißen Kreuz“ führen
3a	05.09. – 20.09.2026	Sanierung B 35 zw. Abfahrt L 556 und A 5 mit gegenläufigem Verkehr auf der Südseite <i>(Detailübersicht sep. Folie)</i>	-Umleitung B 35 von Bretten in Ri. A 5 durch Ortsdurchfahrt (OD) Bruchsal zur B 35a	Sehr starke Belastung erwartet > Mehrverkehr in der gesamten OD Bruchsal aufgrund Umleitung B 35 Richtung Westen
3b	20.09. – 04.10.2026	Sanierung B 35 zw. Abfahrt L 556 und A 5 mit gegenseitigem Verkehr auf der Nordseite <i>(Detailübersicht sep. Folie)</i>	-Umleitung über Bruchsal -Kreiseln über T + R	Sehr starke Belastung erwartet > Umleitung der B 35 von Westen kommend

Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

Detailbetrachtung BA 3a mit hoher Verkehrsbelastung für Bruchsal

BA	Zeitraum	Maßnahme	Betroffenheit Bruchsal	Auswirkung
3a	05.09. – 20.09.2026	Sanierung B 35 zw. Abfahrt L 556 und A 5 mit gegenläufigem Verkehr auf der Südseite	-Umleitung B 35 von Bretten in Ri. A 5 durch Ortsdurchfahrt (OD) Bruchsal zur B 35a	Sehr starke Belastung erwartet > Stau in der gesamten OD Bruchsal aufgrund Umleitung B 35 Richtung Westen

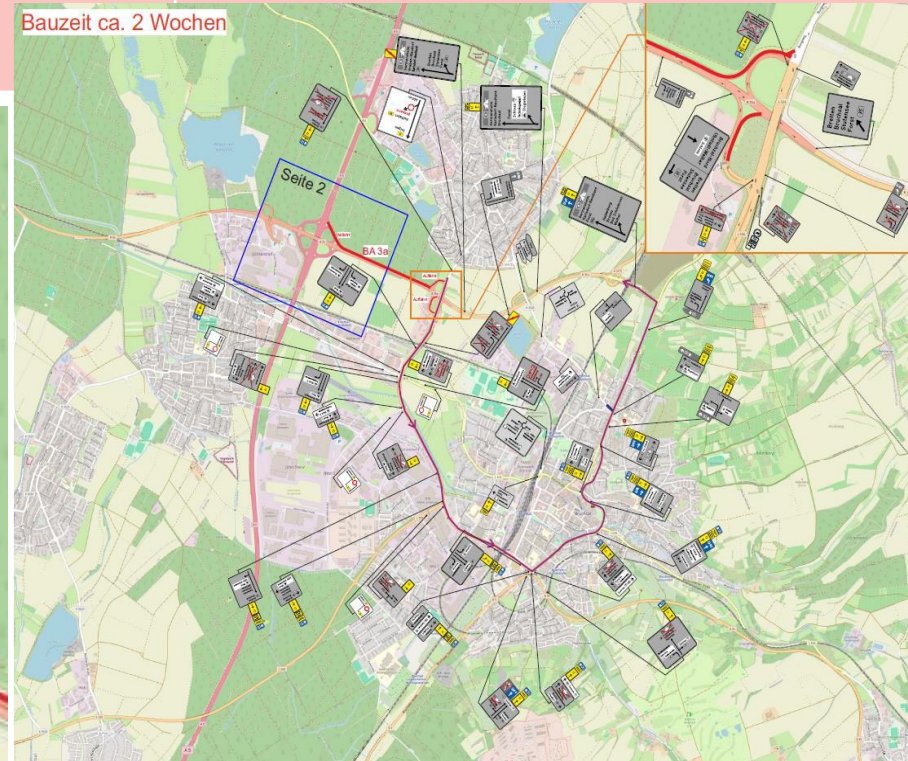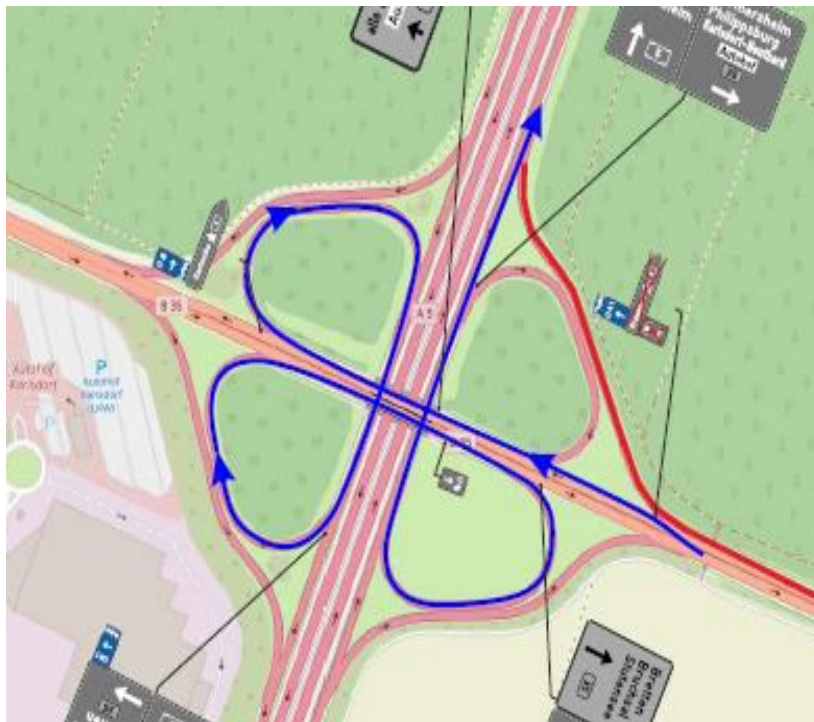


Maßnahmen:
-betroffene LSA in Umleitungsrichtungen schalten
-u.a. Knoten B 3 / K 3526, B 3 / Gutleutstraße / Balthasar-Neumann-Straße

Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

Detailbetrachtung BA 3b mit hoher Verkehrsbelastung für Bruchsal

BA	Zeitraum	Maßnahme	Betroffenheit Bruchsal	Auswirkung
3b	20.09. – 04.10.2026	Sanierung B 35 zw. Abfahrt L 556 und A 5 mit gegenseitigem Verkehr auf der Nordseite	-Umleitung über Bruchsal -Kreiseln über T + R	Sehr starke Belastung erwartet > Umleitung der B 35 von Westen kommend

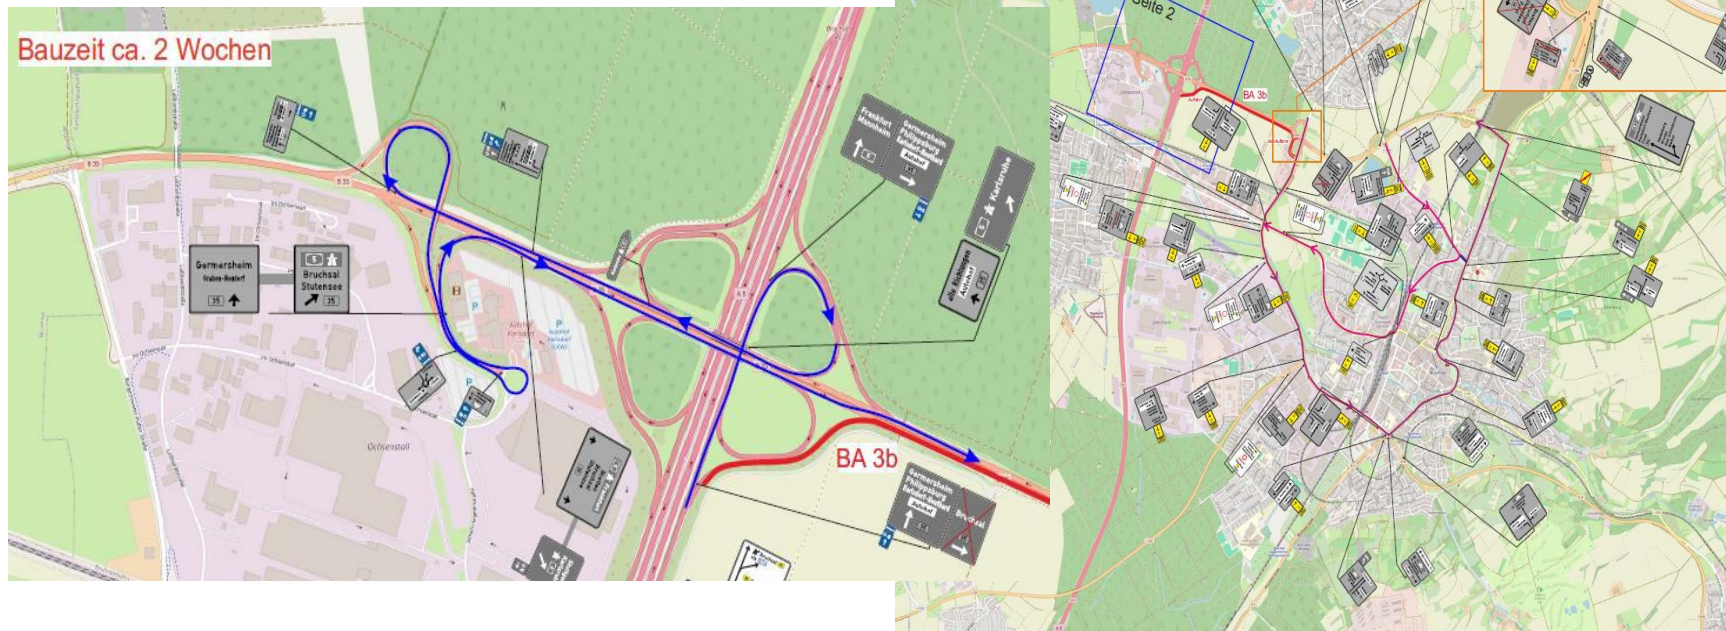

Maßnahmen:
-betroffene LSA in Umleitungsrichtungen schalten
-u.a. „MediaMarkt“

Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

Detailbetrachtung Umleitungsverkehr Bruchsal BA 3b (20.09. – 04.10.2026)



Umleitung über
Bruchsal
Kreiseln über T + R

**Sehr starke
Belastung erwartet >**
Umleitung der B 35
von Westen
kommend

Rot - - - - - sehr starke Belastung
Orange - - - - - starke Belastung

Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

Bauablaufplan und verkehrliche Auswirkungen auf Bruchsal

BA	Zeitraum	Maßnahme	Betroffenheit Bruchsal	Auswirkung
4a-d	04.10.2026 17.03.2027	Sanierung AS BAB A 5 (Teilspernung der Anschlussstelle / Durchfahrt Ost/West offen)	-B 35 an AS Bruchsal, Südhälfte + zeitl. versetzt Nordhälfte gesperrt -großräumige Umleitung über Kronau, KA-Nord und über B 36	Keine / geringe Belastung erwartet
5a-b	17.03. – 28.03.2027	Sanierung B 35 + Anschlussstelle (Umleitung Gegenfahrbahn)	-Umleitungen nur nördlich	Keine Belastung erwartet
6	12.04. – 09.05.2027	Sanierung B 35 (Teilspernung der Anschlussstelle / Durchfahrt Ost/West gesperrt) <i>(Detailübersicht sep. Folie)</i>	-großräumige Umleitung über Kronau und B 36 / L 558	Hohe Belastung auf der L 558 erwartet
7	09.05. – 07.06.2027	Sanierung B 35 (Durchfahrt Ost/West gesperrt) <i>(Detailübersicht sep. Folie)</i>	-großräumige Umleitung über Kronau und B 36 / L 558	Sehr hohe Belastung auf der L 558 erwartet

Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

Detailbetrachtung BA 6 mit hoher Verkehrsbelastung für Bruchsal

BA	Zeitraum	Maßnahme	Betroffenheit Bruchsal	Auswirkung
6	12.04. – 09.05.2027	Sanierung B 35 (Teilspernung der Anschlussstelle / Durchfahrt Ost/West gesperrt)	-großräumige Umleitung über Kronau und B 36 / L 558	Hohe Belastung auf der L 558 erwartet



Maßnahme:
-LSA B 35 / L 558
Vorrangschaltung
für Linksabbieger
L 558

Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

Detailbetrachtung BA 7 mit hoher Verkehrsbelastung für Bruchsal


BA	Zeitraum	Maßnahme	Betroffenheit Bruchsal	Auswirkung
7	09.05. – 07.06.2027	Sanierung B 35 (Durchfahrt Ost/West gesperrt) <i>(Detailübersicht sep. Folie)</i>	-großräumige Umleitung über Kronau und B 36 / L 558	Sehr hohe Belastung auf der L 558 erwartet



Maßnahme:
-LSA B 35 / L 558
Vorrangschaltung
für Linksabbieger
L 558

Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

Detailbetrachtung Umleitungsverkehr Bruchsal BA 6 (12.04. – 09.05.2027)

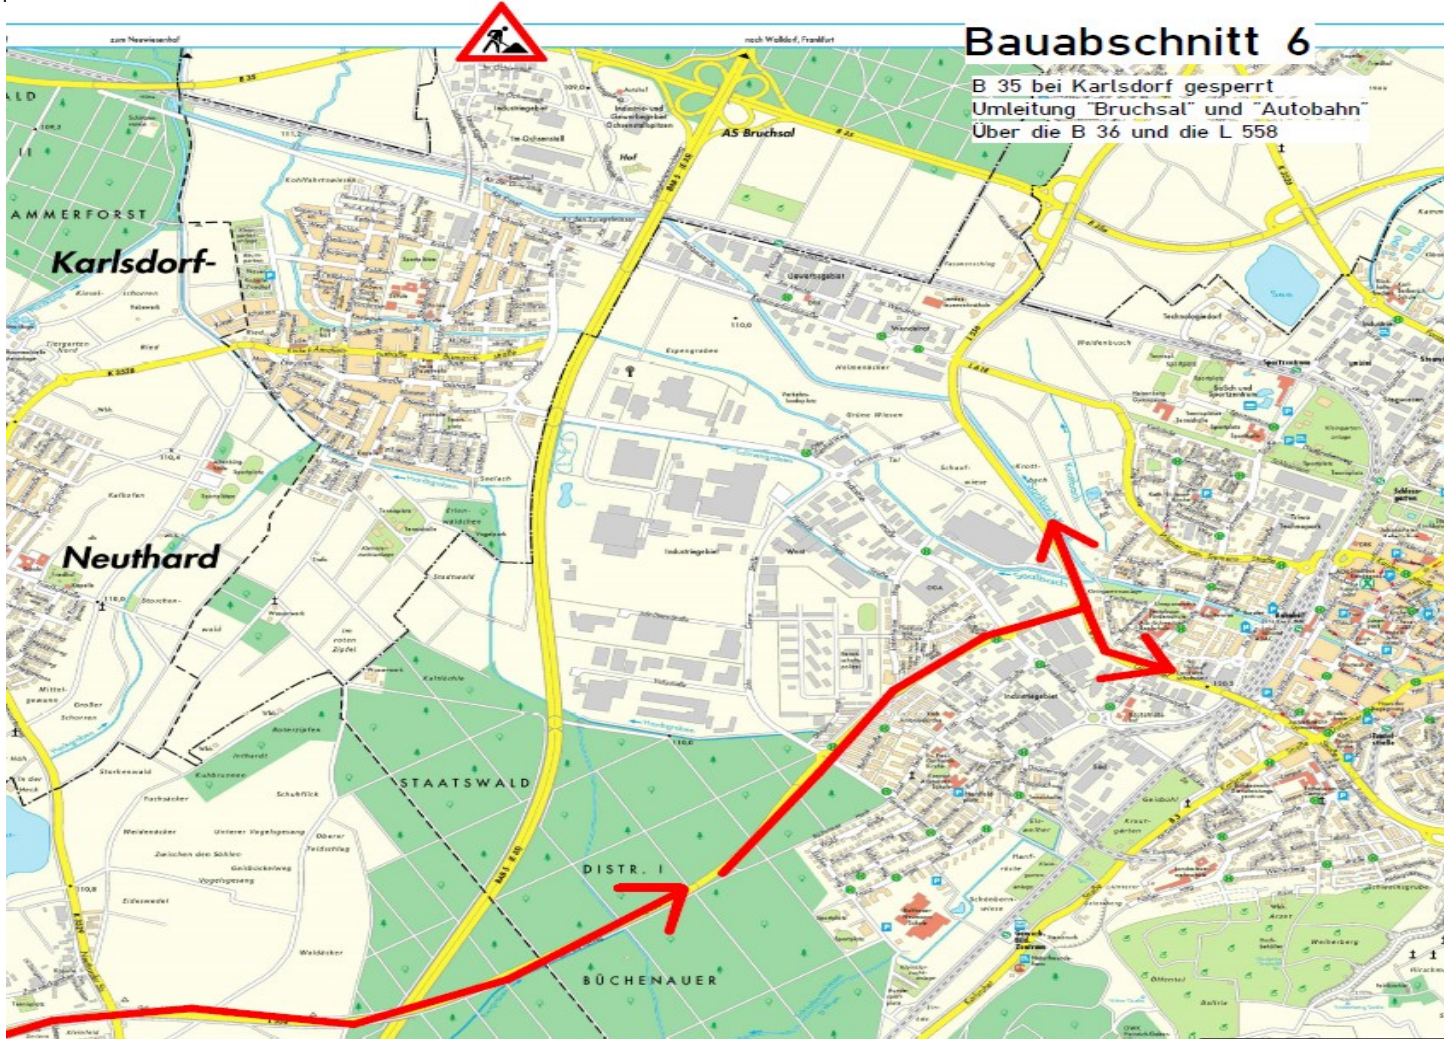


Großräumige
Umleitung über
Kronau und B 36 /
L 558

Hohe
Belastung auf
der L 558
erwartet

Rot ----- sehr starke Belastung

Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

Detailbetrachtung Umleitungsverkehr Bruchsal BA 7 (09.05. – 07.06.2027)

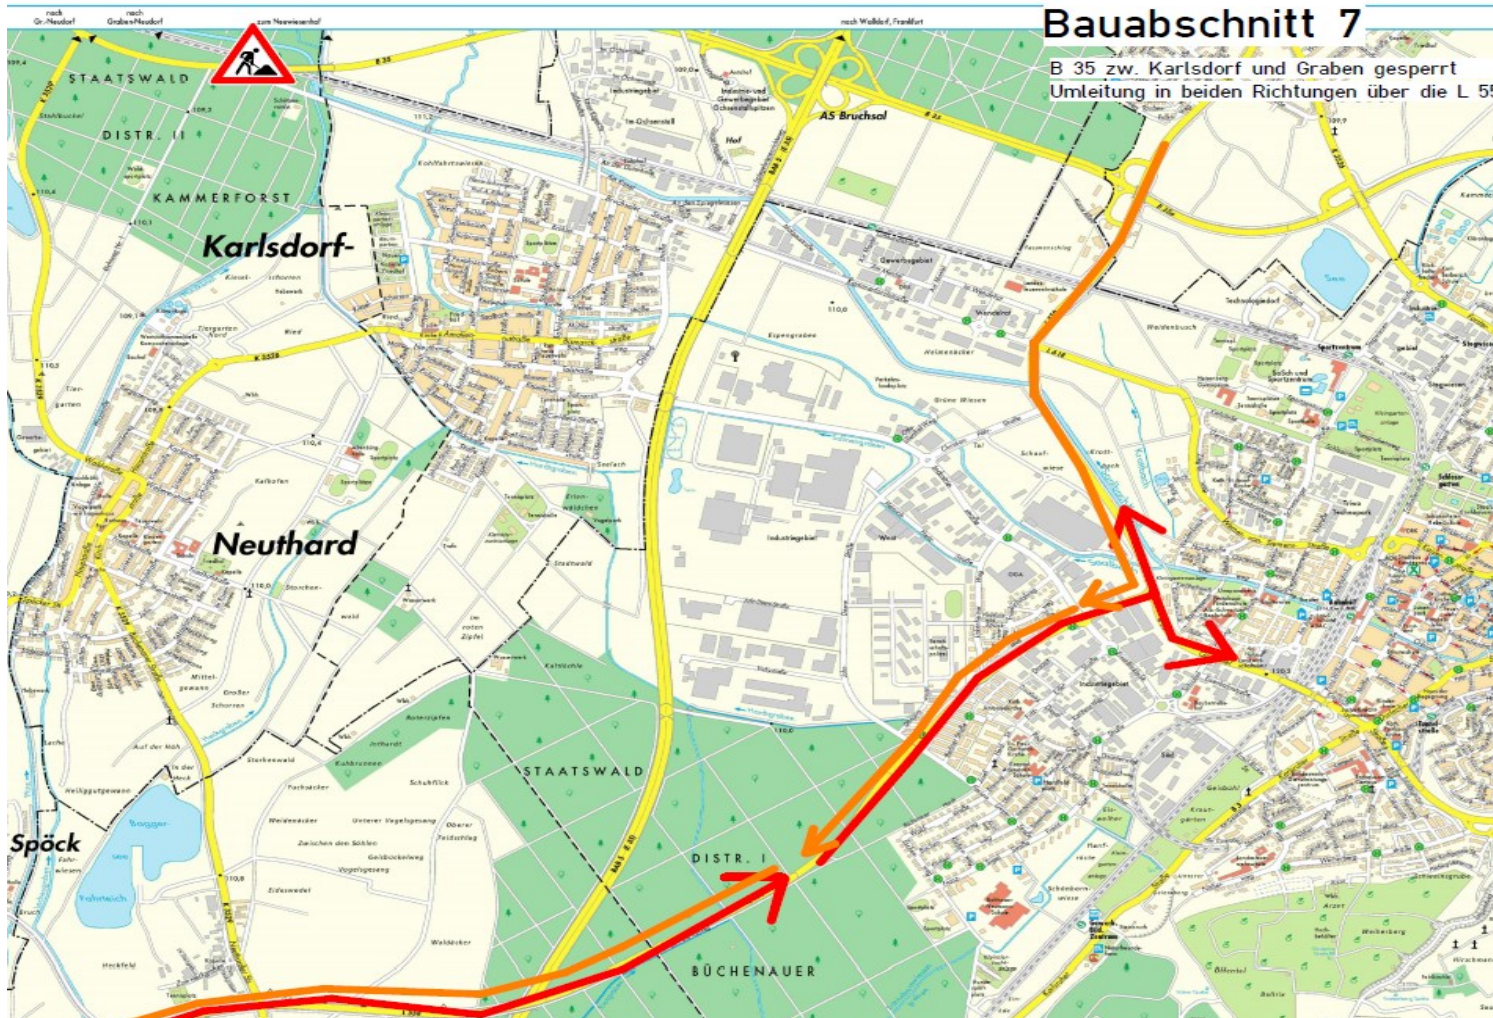

Großräumige Umleitung über Kronau und B 36 / L 558

Sehr hohe Belastung auf der L 558 erwartet

Rot ----- sehr starke Belastung
Orange ----- starke Belastung

Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit

- Auf der **Projektwebsite des RP KA** sind weitergehende Informationen, auch zur geplanten Verkehrs- und Umleitungsführung eingestellt.
- <https://rpk.baden-wuerttemberg.de/abt4/referat-472-baureferat-mitte/aktuelle-strassenbaumassnahmen/b-35-fde-bruchsal/>
- In Abstimmung mit den umliegenden Kommunen werden die betroffenen Gewerbetreibenden gesondert über die Bauarbeiten und die geplante Verkehrsführung informiert.
- Regelmäßige **Pressemeldungen** durch das RP KA (Tageszeitung und Amtsblatt).
- Pressearbeit der Stadt Bruchsal: Je nach BA gesonderte Information bzgl. Umleitungsverkehr.
- Weitere Informationen unter **VerkehrsInfo BW** mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der "VerkehrsInfo BW" - App.



Fahrbahndeckenerneuerung B 35 zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf

Überblick zeitlich flankierende Baumaßnahmen in Bruchsal (August 2026 - Juni 2027)

Geplanter Zeitraum	Maßnahme	Terminkollisionen
1 Woche im Juli 2026 (konkreter Zeitraum noch nicht bekannt)	Sperrung B 3 am Damianstor Maßnahme muss bis spätestens 31.07.2026 beendet sein	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Knoten L 56 / B 35 / L 618 („MediaMarkt“): für Juli 2026 angekündigte Sanierung an zwei Wochenenden; bis dato kein Antrag vorliegend – nicht realisierbar vor Beginn Fahrbahndeckenerneuerung B 35</p> </div>
Juni / Juli 2026 a) 26.06. – 29.06.2026 b) 06.07. – 08.07.2026 c) 13.07. – 14.07.2026 d) 28.07. – 30.07.2026	Abbau Stommasten a – c) Vollsperrung Christian-Pähr-Straße in drei Zeiträumen d) Nächtliche Vollsperrung B 35 zw. Christian-Pähr-Straße und L 558	
02.07. – 07.07.2026	Vollsperrung Baustelle ZOB zum Deckeneinbau	
Beginn September 2026 a) ab September 2026 b) ab 2027 (für 2026 abgelehnt) c) ab 2027	Verlegung Fernwärme a) Schwetzingen Straße b) Werner-von-Siemens-Straße c) L 558 zw. Industriestraße und B 35	
07.09. – 18.09.2026	Brückensanierung B35, Brücke über Prinz-Wilhelm-Straße BW 6817-518	Anmerkung: Auffahrt über Moltkestraße bleibt nutzbar
8 Tage im Dezember 2026 (jeweils über Nacht)	Halbseitige Sperrung Restarbeiten DB an Bahnbrücke Siemens- Unterführung	Ablehnung für Juli / August 2026
